

تسابق الكويت الزمن في إقامة المشاريع التنموية الكبرى التي تحقق طموحات المواطنين في رؤية وطنهم وقد ارتدى حلة تليق به، في هذه الصفحة نصف الشهرية، سنتلقى في كل مرة الضوء على أحد هذه المشاريع، لتسريع خطوات الإنجاز، وحلحلة أي معوقات تعترض طريقه، للتواصل مع الصفحة: d.project@alanba.com.kw



مشاريع تنموية

بتكلفة تتجاوز 165 مليون دينار والانتهاؤ منها في أواخر 2018

«وصلة الدوحة» تربط جنوب البلاد بشمالها




جانب من أعمال المشروع

العابدين: طول المشروع يبلغ 12 كم ونسبة الإنجاز الفعلي بلغت 19% الأعمال المنفذة بلغت حتى الآن ما يقارب 9 ملايين دينار



م. محمد العابدين

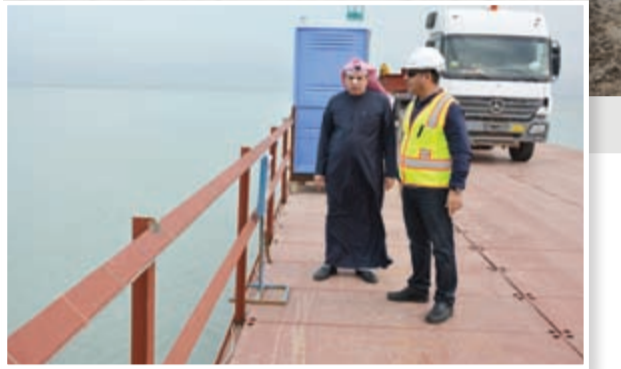

م. محمد العابدين والزميل فرج ناصر في جولة بالمشروع

الأمير مع بعض المبانى التابعة لبعض الجهات مثل محمية الشيخ زايد والمحمية البحرية التابعة لهيئة الزراعة وكذلك مبان تابعة لوزارة المالية.

وماذا عن مراحل المشروع؟
● بالطبع المشروع الآن في مرحلة التصميم وهو ينقسم الى قسمين: مرحلة تصميم ومرحلة تنفيذ.

ونسب الإنجاز طبقا للبرنامج الزمني المعدل؟

● الإنجاز المفترض 15% والإنجاز الفعلي 18% أما نسبة التأخير فلا توجد.

المنفذة، وما تم صرفه حتى الآن؟
● بلغت حتى الآن ما يقارب 9 ملايين دينار، وما تم صرفه حتى الآن حوالي 7 ملايين دينار و520 ألف دينار.

متى تم البدء في المشروع؟ وما المدة المتبقية للمشروع؟
● تمت المباشرة في المشروع في 30 ديسمبر من عام 2014، والمدة المتبقية بلغت تقريبا 326.

هل هناك معوقات واجهت المشروع؟
● نعم ولكن كانت في بداية

في منطقة الدوحة حيث تم الانتهاء من تركيب 37 فتحة من اجمالي 120 فتحة وبلغت نسبة الإنجاز 31%، وكذلك جسر العمل في إزالة ونقل وزرع الأشجار الواقعة عند تقاطع المدينة الترفيهية حيث بلغت نسبة الإنجاز 89%، وايضا العمل في التحويلات المرورية عند تقاطع المدينة الترفيهية وتقاطع الدوحة حيث بلغت نسبة الإنجاز 48%.

هل من اوامر تغييرية طرأت على المشروع؟
● لا توجد أي أوامر تغييرية حتى الآن في الوقت الحالي وأن احتاج الأمر لذلك فسيتم التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

كم بلغت تكلفة الاعمال

وخدمات الجهات الحكومية، كم تكلفة المشروع الاجمالية، ومتي سيتم الانتهاء منه؟
● تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 165,708 مليون دينار تشمل جميع اعمال المشروع، وسيتم الانتهاء منه في الثلاثين من ديسمبر من عام 2018.

ما الاعمال التي تم تنفيذها حتى الآن؟
● تم البدء في الاعمال الدائمة في منطقة الدوحة حيث تم صب الخازوق TP02 ثم اجراء اختبار التحميل له، وجر العمل في تجهيز محطة خلط الخرسانة حيث بلغت نسبة الإنجاز 95%، وكذلك العمل على تجهيز معمل القطع الخرسانية مسبقة الصنع حيث بلغت نسبة الإنجاز 96%، وتجهيز وتركيب الجسر المؤقت

طريق الجهراء وطريق الدوحة السريع، ثم تقاطع الدوحة بطول 1620 كم ويؤمن الوصول الى الطرق المحلية التي تشبه العقارات السكنية والتجارية، كما سيوفر الوصول الى محطة وزن الشاحنات والمكاتب التي تم تضمينها في العقد وطريق الدوحة بطول 1785 كم ويربط تقاطع المدينة الترفيهية مع تقاطع الدوحة بالإضافة الى المباني التالية: مركز ادارة وصيانة الجسر ومركز المراقبة والتحكم المروري ومحطة وزن الشاحنات.

ويتكون من ثلاثة اجزاء هي: الجسر الغربي بطول 5,22 كم ويمتد من شبه جزيرة الدوحة الى الشرق عبر خليج الصليبخات، والجسر الرئيسي بطول 0,600 كم والذي يستمر من الجسر الغربي عبر الجزء الأعمق من خليج الصليبخات، والجسر الشرقي بطول 1,900 كم ويستمر من الجسر الرئيسي الى الشرق عبر خليج الصليبخات ويرتبط مع الجسر الرئيسي عند تقاطع ميناء الشويخ.

وما التقاطعات التي يتكون منها المشروع؟
● تقاطع المدينة الترفيهية وهو يؤمن إمكانية الوصول الى جميع الطرق المجاورة حيث مشروع تطوير الجزء الغربي من طريق الدائري الخامس والجزء الأوسط من

مشروع وصلة الدوحة التابع لجسر الشيخ جابر الأحمد يبلغ طوله 12 كيلومترا بعدد 3 حارات بالإضافة الى حارة طوارئ بكل اتجاه، ويربط المشروع بين منطقة ميناء الشويخ وشبه جزيرة الدوحة عبر جون الصليبخات، بالإضافة الى الربط مع الطرق القائمة في الدوحة وتقاطع ميناء الشويخ، كما يربط بين منطقة الدوحة بالقرب من المدينة الترفيهية وصولا الى منطقة الشويخ عند بداية جسر الغزالي وجسر الشيخ جابر بهدف تخفيف الازدحام المروري واستكمال منظومة الطرق في الكويت.

الانباء، قامت بجولة في المشروع للاطلاع عن قرب على ما تم انجازه، كما التقت مدير المشروع م. محمد العابدين لطلعا على بعض تفاصيل المشروع وهم يتكلمون، والتكلفة الفعلية له، ومتي سيتم الانتهاء منه، والعائد من المشروع وما سيحققه من اهداف، فكان هذا الحوار:

المشروع يهدف الى ربط جنوب البلاد بشمالها لاستيعاب الكثافة المرورية المتزايدة والمتوقعة خلال الثلاثين سنة القادمة وضمان انسيابية كاملة لحركة المرور باتجاه كل من مدينة الكويت وميناء الشويخ وميناء الدوحة ومدينة جابر الأحمد ومنطقة الدوحة.



وما المدة الزمنية للمشروع؟
● المدة المقررة 48 شهرا.

ماذا تتضمن اعمال العقد؟
● يتضمن العقد اعمال تصميم وتنفيذ لكامل وصلة الدوحة والذي يشتمل على طريق بري سريع عند منطقة الدوحة بطول 4 كيلومترات وجسر بحري عبر جون الصليبخات بطول 7 كم.

ومم يتكون الجسر البحري؟

كفالة مدى الحياة

خدمة مجانية سنتين**

نضمن أفضل قيمة ما بعد البيع



MIRAGE
إبتداء من
2849 د.ك.



Attrage
إبتداء من
2999 د.ك.



LANCER FORTIS 2015
إبتداء من
3999 د.ك.



LANCER
إبتداء من
4199 د.ك.



موديلات 2016

الآن نستقبلكم وفي خدمتكم بمعرض الري من 8:30 صباحا الى 8:30 مساءً وبشكل متواصل.



Drive@earth

http://www.facebook.com/MitsubishiKuwait
@mitsubishi_kuwait
@mitsubishi_kwt_



www.autoalmulla.com
