




خلال جولة خاصة على المشروع بديل «تيماء» و«الصلبية» ويخدم قرابة 88 ألفاً و780 نسمة

المطيري لـ «الأنباء»: الأعمال في المساكن منخفضة التكاليف متقدمة بـ 7,462٪ عن الجدول الزمني بقيمة 68 مليوناً تقريباً

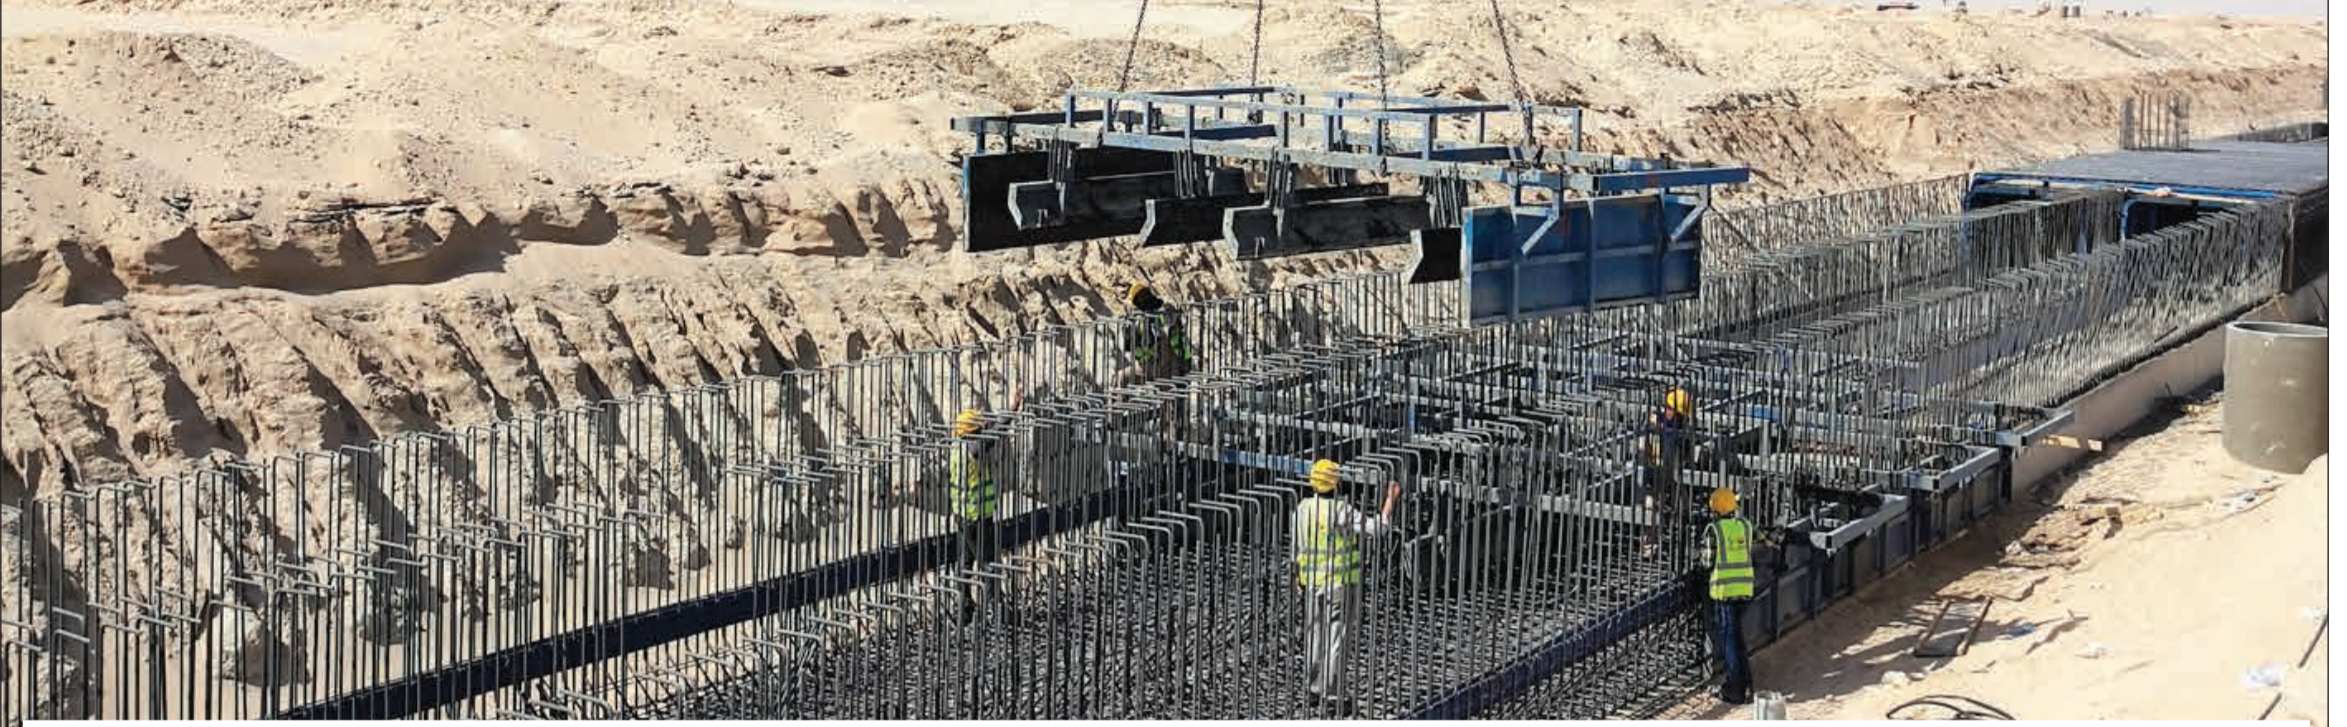

م. ماجد الانصاري وم. فيصل المطيري وم. علي العنزي وم. نيل شينغ



م. فيصل المطيري شارحاً على خريطة المشروع



(محمد هاشم)

م. فيصل المطيري والزميل عادل الشنان

- المشروع يشمل 9800 قسيمة تبلغ مساحة الواحدة منها 200م² ومباني خدمات عامة
- مساحة المشروع تبلغ 830.30 هكتاراً ويحتوي على منطقة حرفية وأخرى للسكن الاستثماري
- مدة العمل 900 يوم من بداية المشروع في 12 ديسمبر 2018 والانتهاه منه في مايو 2021
- صد زحف الرمال الناجم عن طبيعة المنطقة وعوامل الطبيعة بحزام شجري بمساحة 13.85 هكتاراً



أعمال صب الحواجز الإسمنتية

شكر وتقدير للحبيل والمطيري

باقة ورد لنائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون التنفيذ م. علي الحبيل، ولممثل المؤسسة في مشروع منخفضة التكاليف م. فيصل المطيري على تعاونهما في تسهيل مهمة «الأنباء» لعمل الجولة، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة، إضافة إلى ما يبذلانه من جهود وحرص على التنسيق والمتابعة مع جميع العاملين في المؤسسة لإنجاز الأعمال بأسرع ما يمكن ووفقاً للشروط الموضوعية.



سير العمل خلال زيارة «الأنباء» للموقع

السن ومركز صحي تخصصي ومركز صحي عام ومقسم هواتف وموقع صالة أفراح رئيسي وموقع صالة أفراح رجال وموقع صالة أفراح نساء وموقع تنمية اسرية ومركز تنمية المجتمع وموقع وحدة اجتماعية ومجمع حكومي وموقع بيت الزكاة وموقع كهرباء وبختر وموقع مخصص للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وموقع محطة تنقية مؤقت وموقع محطة صرف صحي وموقع مياه أبراج عذبة وموقع خزان الري.

مقسمة للجنسين أيضاً و6 للمرحلة الثانوية أيضاً مقسمة بنين وبنات وعدد 14 مسجداً رئيسياً و2 جامع و8 مواقع لمحطات الكهرباء الرئيسية جهد 132 ك.ف. ومركز إطفاء ومركز اسعاف ومركز فتيات ومركز شباب، و3 حدائق رئيسية عدد 2 موقع للمدارس الخاصة و3 مواقع لدور القرآن الكريم و2 مخفر للشرطة و2 فرع غاز و4 فروع للبنوك المحلية وموقع للسراج المنير ومركز تحفيظ القرآن وموقع وحدة رعاية المسنين وديوان كبار

بواقع 82 عاملاً ناهيك عن توفير المعدات والمواد اللازمة لإنجاز الأعمال بشكل جيد وأكثر مما هو متفق عليه، وهو الأمر الذي ساهم بارتفاع نسبة الإنجاز الفعلي بواقع 7,462٪ مما هو متفق عليه.

الخدمات العامة

وحول مباني الخدمات العامة في أرض المشروع قال المطيري نعمل على إنجاز البنية التحتية لعدد 3 روضة أطفال و10 مدارس ابتدائي مقسمة للبنين والبنات و8 مدارس للمرحلة الابتدائية

ألف تقريبا، ومن المتوقع حسب الدراسات التي سبقت المشروع ان يخدم المشروع قرابة الـ 88 ألفاً و780 نسمة، ومن المقرر للمشروع حسب الشروط التعاقدية ان ينهي المتعهد كل الأعمال بتاريخ 29 مايو 2021 القادم أي خلال مدة 900 يوم منذ بداية المشروع، مؤكداً ان عدد العمالة المطلوبة لإنجاز الأعمال حسب الجدول الزمني محددة بـ 838 عاملاً، الا ان أعداد العمالة الفعلية في أرض المشروع حتى نهاية يونيو الماضي كانت 920 عاملاً، أي أكثر من العدد المحدد

منطقتي تيماء والصلبية، مع سكن استثماري بمساحة 408 هكتارات، ومبان عامة وخدمات رئيسية بمساحة 104,78 هكتارات، وطرق رئيسية بمساحة 155,41 هكتاراً، بالإضافة الى منطقة حرفية (مخازن وقسمات حرفية) بمساحة 16,96 هكتاراً، كما سيتم صد زحف الرمال الناجم عن طبيعة المنطقة وبفعل العوامل الطبيعية بحزام شجري عازل بمساحة 13,85 هكتاراً، وتحديد منطقة خدمات بنية تحتية لأبراج مياه علوية ومحطة معالجة الصرف الصحي على مساحة 20,49 هكتاراً.

وأفاد المطيري بأن تكلفة المشروع تبلغ 68 مليوناً و117

منها 200م²، بالإضافة الى إنشاء خزان للري بسعة 250 ألف جالون وبئر مياه جوفية لتغذية الخزان، مع الأعمال المدنية لمحطات الكهرباء الفرعية لعدد 60 محطة (4 محولات) و89 محطة (2 محول)، مؤكداً ان مشروع المساكن منخفضة التكاليف من احد المشاريع الحيوية للكويت التي تقوم المؤسسة بتنفيذها على مساحة تبلغ 830,30 هكتاراً، وهي تبعد عن مدينة الجاهز 16 كم تقريبا باتجاه جنوب طريق السالمي.

منع زحف الرمال

وبين المطيري ان المشروع يتضمن سكناً خاصاً بمساحة 514,43 هكتاراً، وسيكون بديلاً عن المساكن القائمة في

كان تاريخ البدء بمباشرة أعمال المشروع هو 12 ديسمبر 2018 الماضي، حين تسلم المتعهد حدود المشروع وانتهت الفترة التحضيرية للمشروع بتاريخ 11 مارس 2019 الماضي، علماً بان المتعهد غير مطالب بنسب إنجاز خلال الفترة التحضيرية، وهذا الأمر متعارف عليه في مختلف المشاريع التي تنفذها مختلف جهات الدولة الحكومية، كونها تعتبر فترة خاصة لتجهيز أعمال الموقع من المكاتب الموقعية وتنفيذ أعمال السور حول الموقع. وقال المطيري لـ «الأنباء»: ان المشروع عبارة عن إنشاء وإنجاز وصيانة البنية التحتية لعدد 9800 قسيمة تبلغ مساحة القسيمة الواحدة

عادل الشنان

أكد ممثل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مشروع المساكن منخفضة التكاليف م. فيصل المطيري أن نسبة الإنجاز الفعلية لأعمال إنشاء وصيانة البنية التحتية والطرق الرئيسية ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع المساكن منخفضة التكاليف قد بلغ 12,78٪ حتى نهاية يونيو 2019 الماضي، في حين انها محددة تعاقدياً بـ 5,318٪، أي انها متقدمة على الجدول الزمني بواقع 7,462٪، علماً بان تقدم نسب الإنجاز كان ملحوظاً منذ بدء الأعمال وحساب نسب التحضيرية للمشروع، حيث

وداعاً للسمنة

بأسرع الطرق وأكثرها أماناً

أحدث عملية سمنة لإنقاص الوزن وأكثرها أماناً باستخدام أحدث المناظير الجراحية، منظار البطن ثلاثي الأبعاد.

تمت إشراف د. محمود السيد رئيس قسم الجراحة العامة

- تكويم المعدة (تصغير المعدة) عن طريق الدياسة الجراحية.
- شد البطن مع إزالة الشحوم والترهلات الناتجة عن فقدان الوزن.
- الكسولة الذكية (إزالة المعدة بدون جراحة بدون منظار).

تفان: 99973525 - 66531100
هاتف: 25363093

HADI CLINIC
www.hadclinic.com.kw

مشروع الأضاحي

أضحتك إغاثة وصدقة

أضاحي داخل الكويت	أضحية استرالي	65 د.هـ	أضحية نعيمي	120 د.هـ
أضاحي خارج الكويت	الغنم	من 15 - 85 د.هـ	البقر	من 90 - 500 د.هـ
وقف الأضاحي	تدفع مرة واحدة ويربعها تتصدق كل عام بأضحية	400 د.هـ		

ملاحظة: السعر المعلن يعبر عن متوسط تكلفة الأضحية الواحدة

تبرع أون لاين www.alturath.net

للإتصال: 25339068 - 25362777 (إجمالي: 2643 - 2644)
